

Visite maintenance GRENOBLE

Nom : Grenoble

Prénom : Somafi

Date de réponse : 11/09/2024 14:47:31

Date : 11/09/2024

Consignes de maintenance barrière : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf](#)

Consigne de maintenance porte souple : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf](#)

Consigne de maintenance rideau : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf](#)

Consigne de maintenance niveleur : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf](#)

Consigne de maintenance portail : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf](#)

Consigne de maintenance porte piétonne : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES .pdf](#)

Consigne de maintenance porte sectionnelle : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf](#)

Outillages nécessaire:

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur

Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre,

cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

Localisation site

Nom client : LOCAKASE ST EGREVE

ville : ST EGREVE

Code postal : 38120

PARC SOUS CONTRAT

CONTRAT DE MAINTENANCE :

Equipement : SEC01

Localisation site client :

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : automatique

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : ISEA

Largeur (baie pour les portes) : 3500

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Hauteur ligne arbre :

Plaque signalétique : non

Présence faux plafond : oui

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Usure du marquage au sol , Feu clignotant à remplacer

Modèle feu clignotant :

Longueur marquage au sol : 3500

Photo marquage au sol :



Prise le 11/09/2024 11:24:33

Anomalie / composant autres : marquage au sol à revoir

Etat : Travaux obligatoires

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1h


Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : 6 M

rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : R

Photo équipement :



Prise le 11/09/2024 10:37:29

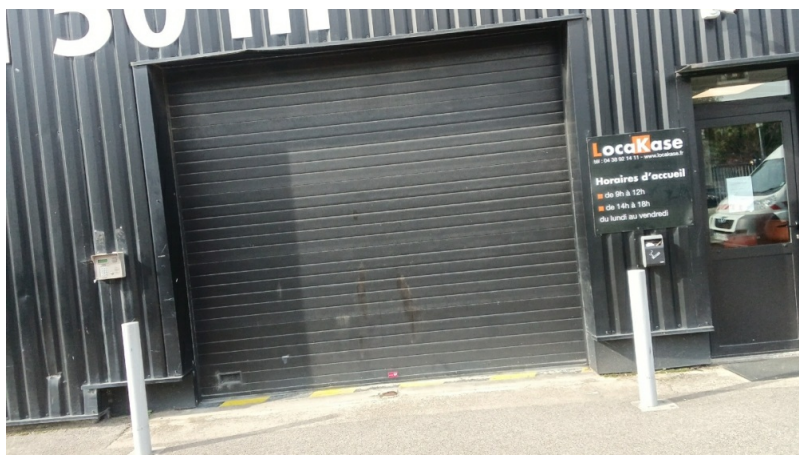

Prise le 11/09/2024 10:38:06

Equipement : SEC02

Localisation site client :

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : automatique

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : ISEA

Largeur (baie pour les portes) : 3495

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Hauteur ligne arbre :

Plaque signalétique : non

Présence faux plafond : oui

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Marquage au sol à effectuer, Joint à remplacer

Longueur marquage au sol : 3495

Photo marquage au sol :



Prise le 11/09/2024 10:45:29

Type de joint : Vertical

Marque joint :

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux obligatoires

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1h

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : R

Photo équipement :



Prise le 11/09/2024 10:46:41

Equipement : SEC03

Localisation site client :

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : ISEA

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur ligne arbre :

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond :

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 11/09/2024 10:51:43

Equipement : SEC04

Localisation site client :

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : automatique

Annee : 2017

N° de série : CEPsIV40111709574 CNV-1017-13005

Marque : ISEA

Largeur (baie pour les portes) : 3500

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Hauteur ligne arbre :

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :




Prise le 11/09/2024 10:59:08

Présence faux plafond : oui

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Marquage au sol à effectuer

Longueur marquage au sol : 3500

Photo marquage au sol :

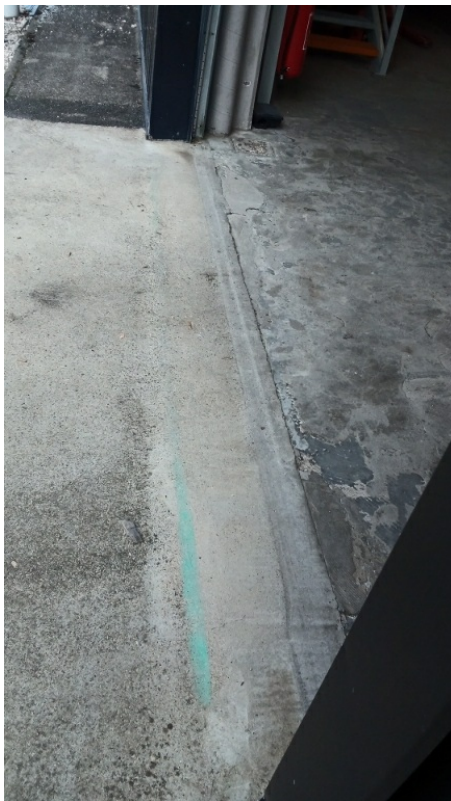

Prise le 11/09/2024 10:59:36

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux obligatoires

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1h

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : R

Photo équipement :



Prise le 11/09/2024 10:56:11

Equipement : PEX02

Localisation site client :

NATURE : Portail

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : NICE

Largeur (baie pour les portes) : 6000

Hauteur (baie pour les portes) : 1790

Plaque signalétique : non

Type portail : Coulissant

Anomalie portails : Usure du marquage au sol

photo marquage au sol :



Prise le 11/09/2024 11:17:31

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux obligatoires

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1h

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : R

Photo équipement :



Prise le 11/09/2024 11:18:13

Equipement : PEX01

Localisation site client :

NATURE : Portail

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : NICE

Largeur (baie pour les portes) : 6000

Hauteur (baie pour les portes) : 1773

Plaque signalétique : non

Type portail : Coulissant

Anomalie portails : Usure du marquage au sol

photo marquage au sol :



Prise le 11/09/2024 11:21:02

Anomalie / composant autres : grillage non conforme

Etat : Travaux obligatoires

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1h

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : R

Photo équipement :



Prise le 11/09/2024 11:22:06

Equipement supplémentaire

Commentaire interne :

TRIGRAMME : sgu/ jsa/ nsz

Signature tech :

Three handwritten signatures in black ink, arranged vertically. The first signature is a stylized 'S' with a horizontal line. The second signature is a stylized 'S' with a horizontal line. The third signature is a stylized 'S' with a horizontal line.
